



Notion




Choix de l'outil de gestion de projet:

“Notion.so”

—

Une Synthèse Stratégique

Introduction à Notion

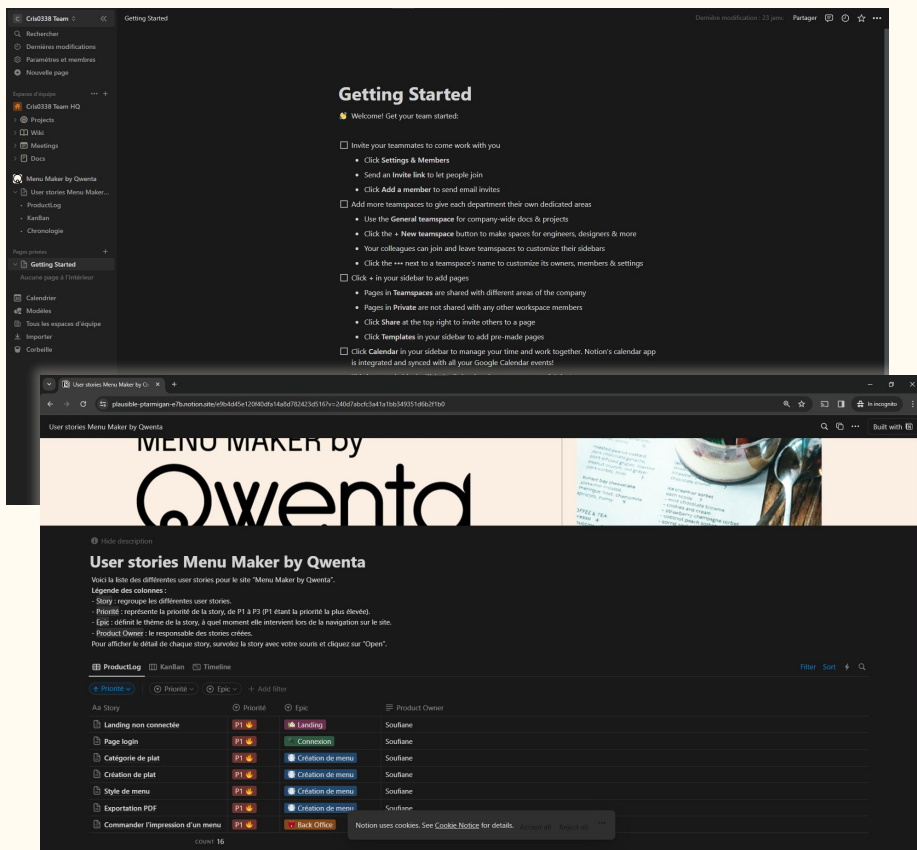

Organisation

- Notion est un outil polyvalent pour la gestion de projet, offrant des fonctionnalités telles que des notes, des bases de données, des calendriers, des rappels et la possibilité de partage même en format page web.

<https://shorturl.at/hjtw1>

<https://shorturl.at/lmBDE>

- Ce choix s'est imposé pour sa flexibilité et son adaptabilité aux exigences variées de notre projet.

User Stories

The screenshot shows a Notion Kanban board for 'ProductLog'. It features a header with navigation tabs (ProductLog, KanBan, Chronologie) and filter buttons (Priorité, 1 règle, Priorité, Epic, Ajouter un filtre). The board is organized into columns: 'Aa Story', 'Priorité', 'Epic', 'Product Owner', and an empty column. Each row represents a user story with its priority, mapped task, and owner.

Aa Story	Priorité	Epic	Product Owner
Landing non connectée	P1 🟡	Landing	Soufiane
Page login	P1 🟡	Connexion	Soufiane
Catégorie de plat	P1 🟡	Création de menu	Soufiane
Création de plat	P1 🟡	Création de menu	Soufiane
Style de menu	P1 🟡	Création de menu	Soufiane
Exportation PDF	P1 🟡	Création de menu	Soufiane
Commander l'impression d'un menu	P1 🟡	Back Office	Soufiane
Menus précédents	P1 🟡	-	Soufiane
Informations légales	P2 🟠	Landing	Soufiane
Tarifs	P2 🟠	Landing	Soufiane
Exportation Deliveroo	P2 🟠	Création de menu	Soufiane
Partage sur Instagram	P2 🟠	Création de menu	Soufiane
Déconnexion	P2 🟠	Connexion	Soufiane
Infos utilisateur	P2 🟠	-	Soufiane
Dashboard	P2 🟠	-	Soufiane
Branding restaurateur	P3 🟠	-	Soufiane

+ Nouveau

DÉCOMPTÉ 16

Des User Stories aux Tâches

- Les User Stories, expressions des besoins des utilisateurs, sont le point de départ de notre planification.
- Transformation de ces récits en tâches concrètes dans Notion, assignation de priorités et catégorisation.

Estimation du Temps

Tâches					
Par projet Tableau kanban Toutes les tâches Chronologie +					
État Personne assignée Échéance Projet + Ajouter un filtre					
Menu Maker by Qwenta 18					
Aa Nom de la tâche	État	Personne assignée	Échéance	Priorité	Résumé
Landing non connectée Front	Pas comme...	Christian Nucida	19 février 2024 → 23 f	Haute	Pour la tâche "Landing non connectée Front", les
Page login	Pas comme...	Christian Nucida	26 février 2024 → 28 f	Haute	Pour la page de connexion, le front-end nécessite
Catégorie de plat	Pas comme...	Christian Nucida	29 février 2024 → 5 m	Haute	Pour améliorer l'interface de gestion des catégori
Création de plat	Pas comme...	Christian Nucida	6 mars 2024 → 12 ma	Haute	Pour le développement de la fonctionnalité de cr
Style de menu	Pas comme...	Christian Nucida	13 mars 2024 → 19 m	Haute	Pour la personnalisation du style de menu, nous r
Exportation PDF	Pas comme...	Christian Nucida	20 mars 2024 → 22 m	Haute	Pour faciliter l'exportation des menus en format F
Commander l'impression d'un me	Pas comme...	Christian Nucida	25 mars 2024 → 26 m	Haute	Pour activer la commande d'impression de menu
Menus précédents	Pas comme...	Christian Nucida	27 mars 2024 → 1 avr	Haute	Pour la gestion des menus précédents, nous aller
Informations légales	Pas comme...	Christian Nucida	2 avril 2024 → 3 avril :	Moyenne	Nous intégrerons une section "Mentions légales"
Tarifs	Pas comme...	Christian Nucida	4 avril 2024	Moyenne	Nous ajouterons un onglet "Tarifs" à la barre de n
Exportation Deliveroo	Pas comme...	Christian Nucida	5 avril 2024 → 10 avr	Moyenne	Pour l'intégration avec Deliveroo, nous commen
Partage sur Instagram	Pas comme...	Christian Nucida	11 avril 2024 → 12 avr	Moyenne	Pour le partage des menus sur Instagram, nous aj
Déconnexion	Pas comme...	Christian Nucida	15 avril 2024 → 17 avr	Moyenne	Pour implémenter une fonctionnalité de déconne
Infos utilisateur	Pas comme...	Christian Nucida	18 avril 2024 → 23 avr	Moyenne	Pour améliorer la gestion des informations utilis
Dashboard	Pas comme...	Christian Nucida	24 avril 2024 → 26 avr	Moyenne	Nous allons enrichir votre tableau de bord avec d
Branding restaurateur	Pas comme...	Christian Nucida	29 avril 2024 → 1 mai	Basse	Pour le projet de branding restaurateur, les tâche
Planifier la réunion de lancement	En cours	Christian Nucida	5 février 2024 → 18 f	Moyenne	Planifier une réunion de lancement du projet, à p
Livraison du Site	Pas comme...	Christian Nucida	2 mai 2024	Haute	Réunion de Lancement : Une réunion finale pour
+ Nouveau					

Estimation Temporelle pour les Tâches

- Chaque tâche reçoit une estimation de temps basée sur sa complexité et ses exigences.
- Saisie de ces estimations dans Notion pour un suivi précis et une allocation efficace des ressources.

Organisation des tâches

Création de plat

Personne assignée: Christian Nucida

État: Pas commencé

Résumé

Échéance: 6 mars 2024 → 12 mars 2024

Projet: Menu Maker by Qwenta

Priorité: Haute

Ajouter une propriété

Ajouter un commentaire...

Attribuer une tâche à quelqu'un
Cliquez pour sélectionner une ou plusieurs personnes

Pour le développement de la fonctionnalité de création de plats, nous allons concevoir une interface utilisateur front-end comprenant une modale d'ajout de plats, avec des champs pour entrer les informations relatives aux plats, et une fonctionnalité pour l'upload et la gestion des images. Nous intégrerons également une option pour sélectionner les catégories de plats et nous assurerons que la modale soit responsive pour une utilisation sur tous les appareils. Des tests et du débogage seront effectués pour garantir la fiabilité de l'interface. Côté back-end, nous développerons des endpoints API pour l'ajout et la modification des plats, mettrons en place la sauvegarde des informations dans la base de données et créerons la logique de gestion des images. Nous effectuerons également des tests d'intégration et veillerons à la sécurité des endpoints.

Front-end

- ☐ Mise en place de la modale d'ajout de plats : 3-4 heures.
- ☐ Création d'éléments d'entrée pour les informations sur les plats : 2-3 heures.
- ☐ Développement de la fonctionnalité d'upload et de gestion des images : 3-4 heures.
- ☐ Mise en place de la sélection des catégories : 2-3 heures.
- ☐ Conception responsive de la modale pour assurer une visualisation correcte sur tous les appareils : 2-3 heures.
- ☐ Tests et débogage de l'interface utilisateur : 2-3 heures.


Back-end

- ☐ Création d'endpoints API pour l'ajout et la modification des plats : 3-4 heures.
- ☐ Mise en place de la sauvegarde des informations des plats dans la base de données : 3-4 heures.
- ☐ Développement de la logique de gestion des images (upload, stockage, récupération) : 4-5 heures.
- ☐ Tests d'intégration et sécurité des endpoints : 2-3 heures.

Cadre Opérationnel et Liste des Fonctions

- Chaque activité est assignée avec une estimation de temps précise, permettant une coordination efficace et une répartition claire du travail entre les développeurs front-end et back-end.
- Cela assure un suivi rigoureux du progrès et une transparence totale pour le client quant aux étapes de développement

Planification et Calendrier

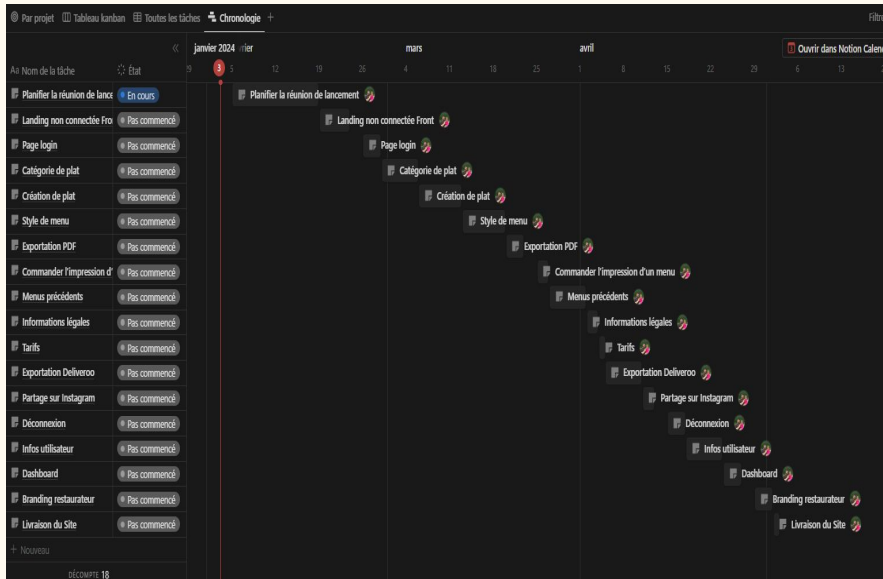

Planification et Calendrier dans Notion

- Utilisation des estimations pour élaborer un calendrier de projet réaliste.
- Des réunions de suivi bi-hebdomadaires seront organisées pour discuter de l'avancement du projet.
- Une réunion de lancement sera organisée avant la livraison finale du site.

Avantages et Conclusions



Avantages de l'Utilisation de Notion

- Notion facilite la gestion d'un projet structurée, une visibilité accrue sur l'avancement et une adaptabilité face aux changements.
 - En résumé, les contributions clés de Notion aident au succès du projet et soulignent l'efficacité de l'outil dans la coordination et la planification des tâches.
-
